

 Informatique Scientifique et Technique	Compte rendu de suivi	Date
Référence : IST-215-T-24		04/02/2025
Affaire : ALLIANCE ENVIRONNEMENT	N° de commande : NC	
Implémentation d'un plugin MS Dynamics en lien avec Visual Planning		
CR de suivi précédent : [ALLIANCE ENVIRONNEMENT – Plugin MSDynamics] CRS_2025.01.15		

Semaine 04 et 05

Ordre du jour

Travaux en cours

Décisions entérinées

Points durs et hors périmètre

Actions

Planning

Avancement

Divers

Annexe 1 : Tableau récapitulatif des risques

Annexe 2 : Tableau récapitulatif des points durs et hors périmètre

Travaux en cours

Mise en place du plugin MSDynamics

Le plugin et les déclencheurs sont en place.

Communication entre le serveur MSD et le serveur VP :

Le plugin est configuré pour mettre à jour un planning déployé sur une VM de test Stilog. Il semble que le serveur Sandbox MS Dynamics n'a pas accès à la VM.

Il faudra s'assurer que le serveur MS Dynamics peut communiquer avec le serveur VP → **point infra à confirmer avec Alliance Environnement.**

Déploiement et configuration :

Actuellement, l'URL du serveur VP et la clé API pour la communication sont renseignés dans le code et donc non configurable. Ce qui signifie que pour chaque environnement le plugin doit être régénéré.

Ce choix doit être validé avec Alliance environnement.

Stilog propose de saisir ces informations de connexion dans une table de MS Dynamics → **à définir.**

Lien avec Visual Planning

Un nouveau VPS a été fourni le 24/01/2025. Dans ce VPS, certaines rubriques de type liste de choix ne sont pas initialisées :

	Compte rendu de suivi	Date
Référence : IST-215-T-24		04/02/2025

- Client : civilité et topologie

Il manque également sur les dimensions concernées par le mapping (CLIENTS, ADRESSES INTERVENTIONS, CONSULTATIONS & OFFRES & COMMANDES) une rubrique « UID-MSD » permettant de stocker l'identifiant MS Dynamics.

Le nouveau VPS a été fourni ce jour avec ces points corrigés.

Mapping des données

Certains champs mentionnés dans le fichiers Excel de mapping n'ont pas été trouvés côté MS Dynamics. Le fichier Excel avec les annotations est fourni en copie avec ce compte-rendu. **→ nécessité de faire un point dédié.**

Pour le mapping, certaines rubriques de MS Dynamics sont des entités qui ont leur équivalent côté VP mais qui ne sont pas gérées par le plugin. Pour faire la correspondance, il est nécessaire d'établir les clés de rapprochement entre les entités MSDynamics et VP.

Les ressources concernées et leurs identifiants MSD et VP sont les suivants :

- METIER :
- PERSONNEL :
 - o Nom complet : identifiant MS
 - o Trigramme : identifiant VP
- SITE

→ nécessité de faire un point dédié.

Décisions entérinées

RAS

Points durs et hors périmètre

RAS

Actions

La liste des actions identifiées, leur porteur, leur statut de réalisation ainsi que leur échéance est présentée ci-dessous. En **vert** une action réalisée, en **bleu** une action en cours et en blanc une action non démarrée et en **gris** une action annulée.

 Informatique Scientifique et Technique	Compte rendu de suivi	Date
Référence : IST-215-T-24		04/02/2025


Date	Description	Porteurs	Echéance	Réalisation
14/01/2025	Nouveau VPS	Stilog VP	17/01/2025	24/01/2025 04/02/2025
04/02/2025	Réunion pour compléter le mapping	Stilog / Alliance Environnement	07/02/2025	
04/02/2025	Confirmer le choix pour les id de connexion	Alliance Environnement	A définir	

Planning

Livraisons prévisionnelles

- Lot 1 : ~~31/01/2025~~ → à définir

Avancement

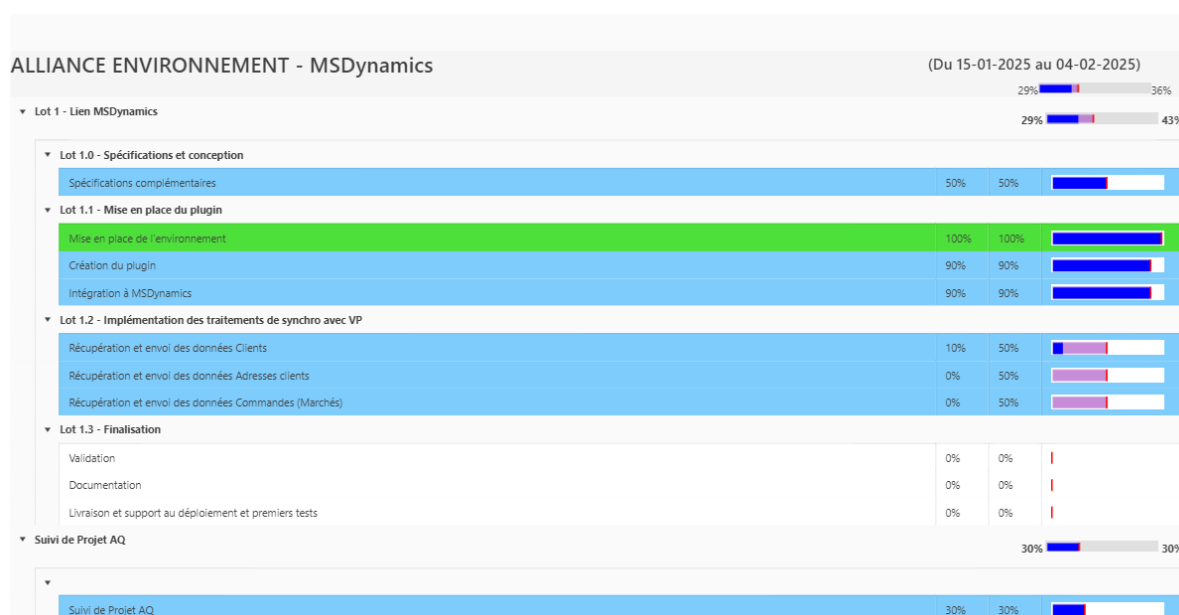

Divers

RAS

	Compte rendu de suivi	Date
Référence : IST-215-T-24		04/02/2025

Visas	Stilog IST	F. Girardot
	[Client]	[nom client]

 Informatique Scientifique et Technique	Compte rendu de suivi	Date
Référence : IST-215-T-24		04/02/2025

Annexe 1 : Tableau récapitulatif des risques

N°	Intitulé du risque	Cotation avant plan de mitigation				Plan de Mitigation			Cotation après plan de mitigation		Actions correctives en cas d'expression du risque
		Prob. (1 – 4)	Evol. ↗ → ↘	Gravité (1 – 4)	Evol. ↗ → ↘	Actions préventives	Porteur	Date	Prob. (1 - 4)	Gravité (1 - 4)	

Tableau 1 : En vert, aucun plan de mitigation n'est nécessaire ; en orange, plan de mitigation conseillé ; en rouge, plan de mitigation obligatoire.

	Probabilité	1	2	3	4
Gravité		Faible	Moyenne	Importante	Très importante
4	Très grave				
3	Grave				
2	Moyenne				
1	Faible				

	Compte rendu de suivi	Date
Référence : IST-215-T-24		04/02/2025

Annexe 2 : Tableau récapitulatif des points durs et hors périmètre

N°	Intitulé	Hors périmètre	Réalisé	Temps (h)
		☐	☐	
