

 Informatique Scientifique et Technique	Compte rendu de suivi	Date
Référence : IST-215-T-24		14/02/2025
Affaire : ALLIANCE ENVIRONNEMENT	N° de commande : NC	
Implémentation d'un plugin MS Dynamics en lien avec Visual Planning		
CR de suivi précédent : [ALLIANCE ENVIRONNEMENT – Plugin MSDynamics] CRS_2025.02.04		

Semaine 06 et 07

Ordre du jour

Travaux en cours

Décisions entérinées

Points durs et hors périmètre

Actions

Planning

Avancement

Divers

Annexe 1 : Tableau récapitulatif des risques

Annexe 2 : Tableau récapitulatif des points durs et hors périmètre

Travaux en cours

Mapping des données

Mapping dans le plugin :

Le mapping des données a pu être complété suite au point du 05/02/2025.

- Table CLIENT : traitée complètement
- Table MARCHE :
 - Référent d'exploitation : n'est pas présent dans Visual Planning → contacter Marthe B.
- Adresses chantier : → Table MSD « Adresse Livraison »
 - Mapping à faire

Une réunion est prévue lundi avec Maxime Colle pour valider le mapping établi.

Correspondance MSD et VP :

Les champs MSD_UID ont été ajoutés dans les dimensions qui nécessitent une correspondance :

- METIER
- PERSONNEL
- SITE

Les données ne sont pas initialisées dans le VPS. → reprise des données à venir côté Marthe B.

 Informatique Scientifique et Technique	Compte rendu de suivi	Date
Référence : IST-215-T-24		14/02/2025

Les correspondances de données entre celles présentes dans VP et celles dans MSD ont été envoyées complétées par Alliance Environnement le 07/02/2025.

Cependant, concernant les sites, on remarque qu'un site MSD est lié à 3 sites VP.

8	LUNEL - DESHYDRATATION	LUNEL - DESHYDRATATION	DESHYDRAT	AGENCE LUNEL	A CRÉER DANS VP
9	LUNEL - EXPLOITATION	LUNEL - EXPLOITATION	EXPLOIT	AGENCE LUNEL	
10	LUNEL - PRODUCTION	LUNEL - PRODUCTION	PROD	AGENCE LUNEL	

Il faudra définir quel site choisir lorsque la donnée de MSD porte sur le site AGENCE LUNEL. → **question envoyée par mail.**

Mise en place du plugin MSDynamics

Communication entre le serveur MSD et le serveur VP :

Alliance environnement a mis à disposition un serveur VP avec lequel le serveur MS Dynamics devrait pouvoir communiquer. → test à réaliser en semaine 8.

Déploiement et configuration :

Actuellement, l'URL du serveur VP et la clé API pour la communication sont renseignés dans le code et donc non configurable. Ce qui signifie que pour chaque environnement le plugin doit être régénéré.

Ce choix doit être validé avec Alliance environnement.

Stilog propose de saisir ces informations de connexion dans une table de MS Dynamics → **en attente de confirmation côté Alliance environnement.**

Lien avec Visual Planning

Un nouveau VPS a été fourni le 24/01/2025. Dans ce VPS, certaines rubriques de type liste de choix ne sont pas initialisées :

- Client : civilité et topologie

Il manque également sur les dimensions concernées par le mapping (CLIENTS, ADRESSES INTERVENTIONS, CONSULTATIONS & OFFRES & COMMANDES) une rubrique « UID-MSD » permettant de stocker l'identifiant MS Dynamics.

Le nouveau VPS a été fourni ce jour avec ces points corrigés.

Décisions entérinées

RAS

Points durs et hors périmètre

RAS

Actions

La liste des actions identifiées, leur porteur, leur statut de réalisation ainsi que leur échéance est présentée ci-dessous. En **vert** une action réalisée, en **bleu** une action en cours et en blanc une action non démarrée et en **gris** une action annulée.

 Stilog Informatique Scientifique et Technique	Compte rendu de suivi	Date
Référence : IST-215-T-24		14/02/2025


Date	Description	Porteurs	Echéance	Réalisation
14/01/2025	Nouveau VPS	Stilog VP	17/01/2025	24/01/2025 04/02/2025
04/02/2025	Réunion pour compléter le mapping	Stilog / Alliance Environnement	07/02/2025	05/02/2025
04/02/2025	Confirmer le choix pour les id de connexion	Alliance Environnement	A définir	
05/02/2025	Réunion pour validation du mapping avec M. Colle	Stilog / XEFI	17/02/2025	

Planning

Livraisons prévisionnelles

- Lot 1 : ~~31/01/2025~~ → à définir

Avancement

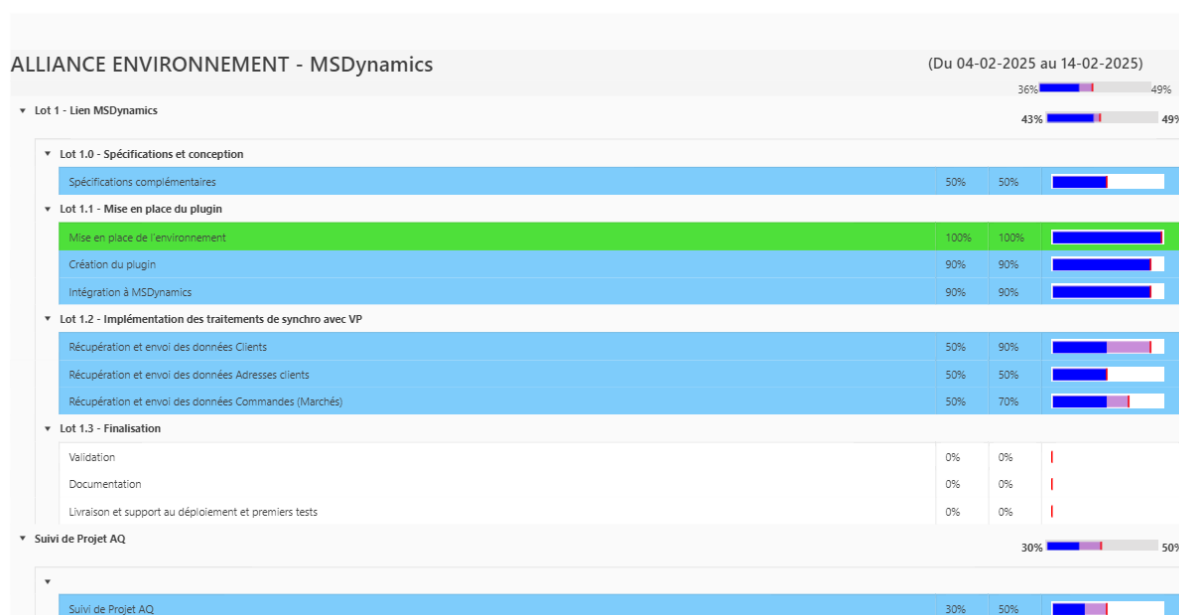

Divers

RAS

	Compte rendu de suivi	Date
Référence : IST-215-T-24		14/02/2025

Visas	Stilog IST	F. Girardot
	[Client]	[nom client]

 Informatique Scientifique et Technique	Compte rendu de suivi	Date
Référence : IST-215-T-24		14/02/2025

Annexe 1 : Tableau récapitulatif des risques

N°	Intitulé du risque	Cotation avant plan de mitigation				Plan de Mitigation			Cotation après plan de mitigation		Actions correctives en cas d'expression du risque
		Prob. (1 – 4)	Evol. ↗ → ↘	Gravité (1 – 4)	Evol. ↗ → ↘	Actions préventives	Porteur	Date	Prob. (1 - 4)	Gravité (1 - 4)	

Tableau 1 : En vert, aucun plan de mitigation n'est nécessaire ; en orange, plan de mitigation conseillé ; en rouge, plan de mitigation obligatoire.

	Probabilité	1	2	3	4
Gravité		Faible	Moyenne	Importante	Très importante
4	Très grave				
3	Grave				
2	Moyenne				
1	Faible				

	Compte rendu de suivi	Date
Référence : IST-215-T-24		14/02/2025

Annexe 2 : Tableau récapitulatif des points durs et hors périmètre

N°	Intitulé	Hors périmètre	Réalisé	Temps (h)
		☐	☐	
