

|                                                                                                                             |                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| <br>Informatique Scientifique et Technique | Compte rendu de suivi | Date       |
| Référence : IST-215-T-24                                                                                                    |                       | 21/03/2025 |
|                                                                                                                             |                       |            |
| Affaire : ALLIANCE ENVIRONNEMENT                                                                                            | N° de commande : NC   |            |
| Implémentation d'un plugin MS Dynamics en lien avec Visual Planning                                                         |                       |            |
| CR de suivi précédent : [ALLIANCE ENVIRONNEMENT – Plugin MSDynamics] CRS_2025.03.03                                         |                       |            |

## Semaines 10 à 12

### Ordre du jour

---

Travaux en cours

Décisions entérinées

Points durs et hors périmètre

Actions

Planning

Avancement

Divers

Annexe 1 : Tableau récapitulatif des risques

Annexe 2 : Tableau récapitulatif des points durs et hors périmètre

### Travaux en cours

---

#### Présentation du plugin MSDynamics

Le plugin a été présenté à Alliance Environnement.

Il répond fonctionnellement au besoin d'après la présentation à savoir, synchronisation pour les actions de Création, Modification et Suppression des entités suivantes : Adresses clients, Commandes, Clients

Pendant la réunion, le mode de configuration de la connexion à VP pour le plugin a été défini (cf. décisions entérinées).

#### Travail restant :

Les travaux suivants sont à faire avant la livraison finale prévue en semaine 14 :

- Créer une Table "INTERCO\_VP" avec les champs url et apikey pour stocker les infos de connexion à VP.
- Rédiger la documentation pour la configuration et déploiement du plugin
- Appliquer les modifications sur le VPS cible pour que le plugin soit fonctionnel : point de synchronisation à planifier en semaine 13.
- Rédiger un dossier de validation du plugin (vidéos des cas : Create/Update/Delete sur chaque flux)

|                                                                                                                                                         |                       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
|  <b>Stilog</b><br><small>Informatique Scientifique et Technique</small> | Compte rendu de suivi | Date       |
| Référence : IST-215-T-24                                                                                                                                |                       | 21/03/2025 |

## Décisions entérinées

### Réunion du 20/03/2025 :

- **Configuration de l'interconnexion VP depuis MSD** : les informations d'URL et APIKey pour l'interconnexion à Visual planning seront stockées dans une table de la BDD MS Dynamics. Cette table s'appellera *INTERCO\_VP*.
- **Mise en production** : Alliance environnement a planifié une date de mise en production le 04 avril. → les livrables seront à fournir avant.

## Points durs et hors périmètre

RAS

## Actions

La liste des actions identifiées, leur porteur, leur statut de réalisation ainsi que leur échéance est présentée ci-dessous. En **vert** une action réalisée, en **bleu** une action en cours et en blanc une action non démarrée et en **gris** une action annulée.

| Date       | Description                                      | Porteurs                        | Echéance   | Réalisation              |
|------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|------------|--------------------------|
| 14/01/2025 | Nouveau VPS                                      | Stilog VP                       | 17/01/2025 | 24/01/2025<br>04/02/2025 |
| 04/02/2025 | Réunion pour compléter le mapping                | Stilog / Alliance Environnement | 07/02/2025 | 05/02/2025               |
| 04/02/2025 | Confirmer le choix pour les id de connexion      | Alliance Environnement          | A définir  | 20/03/2025               |
| 05/02/2025 | Réunion pour validation du mapping avec M. Colle | Stilog / XEFI                   | 17/02/2025 |                          |


## Planning

### Livraisons prévisionnelles

- **Lot 1 : 03/04/2025**
  - Plugin MSD : fichier DLL à intégrer à Plugin Registration Tool
  - Documentation de déploiement et configuration du plugin.
  - Dossier de validation
  - Sources

|                                                                                                                             |                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| <br>Informatique Scientifique et Technique | Compte rendu de suivi | Date       |
| Référence : IST-215-T-24                                                                                                    |                       | 21/03/2025 |

## Avancement

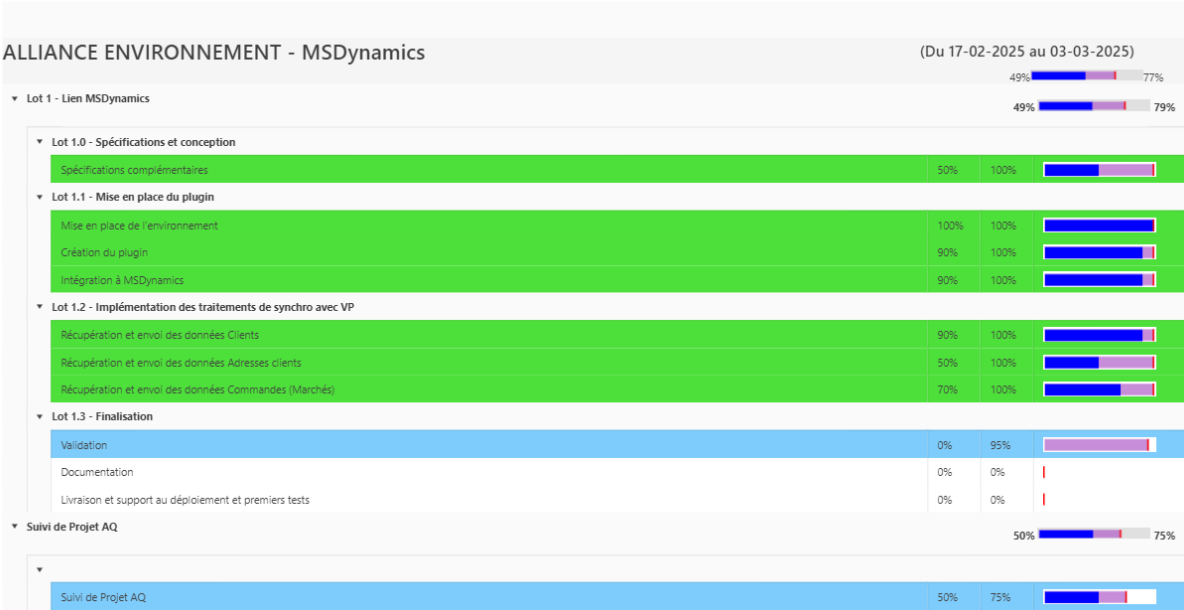

|                                                                                                                                           |                       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| <br><small>Informatique Scientifique et Technique</small> | Compte rendu de suivi | Date       |
| Référence : IST-215-T-24                                                                                                                  |                       | 21/03/2025 |

## Annexe 1 : Tableau récapitulatif des risques

| N° | Intitulé du risque | Cotation avant plan de mitigation |                |                    |                | Plan de Mitigation  |         |      | Cotation après plan de mitigation |                    | Actions correctives en cas d'expression du risque |
|----|--------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------------|---------|------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|
|    |                    | Prob.<br>(1 – 4)                  | Evol.<br>↗ → ↘ | Gravité<br>(1 – 4) | Evol.<br>↗ → ↘ | Actions préventives | Porteur | Date | Prob.<br>(1 - 4)                  | Gravité<br>(1 - 4) |                                                   |
|    |                    |                                   |                |                    |                |                     |         |      |                                   |                    |                                                   |
|    |                    |                                   |                |                    |                |                     |         |      |                                   |                    |                                                   |
|    |                    |                                   |                |                    |                |                     |         |      |                                   |                    |                                                   |
|    |                    |                                   |                |                    |                |                     |         |      |                                   |                    |                                                   |
|    |                    |                                   |                |                    |                |                     |         |      |                                   |                    |                                                   |
|    |                    |                                   |                |                    |                |                     |         |      |                                   |                    |                                                   |
|    |                    |                                   |                |                    |                |                     |         |      |                                   |                    |                                                   |

Tableau 1 : En vert, aucun plan de mitigation n'est nécessaire ; en orange, plan de mitigation conseillé ; en rouge, plan de mitigation obligatoire.

|         | Probabilité | 1      | 2       | 3          | 4               |
|---------|-------------|--------|---------|------------|-----------------|
| Gravité |             | Faible | Moyenne | Importante | Très importante |
| 4       | Très grave  |        |         |            |                 |
| 3       | Grave       |        |         |            |                 |
| 2       | Moyenne     |        |         |            |                 |
| 1       | Faible      |        |         |            |                 |

|                                                                                   |                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
|  | Compte rendu de suivi | Date       |
| Référence : IST-215-T-24                                                          |                       | 21/03/2025 |

## Annexe 2 : Tableau récapitulatif des points durs et hors périmètre

| N° | Intitulé | Hors périmètre           | Réalisé                  | Temps (h) |
|----|----------|--------------------------|--------------------------|-----------|
|    |          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |           |
